


MHI様 進捗管理支援 システムアプローチ

オープン株式会社

※東京証券取引所 プライム市場上場「オープングループ株式会社」グループ会社

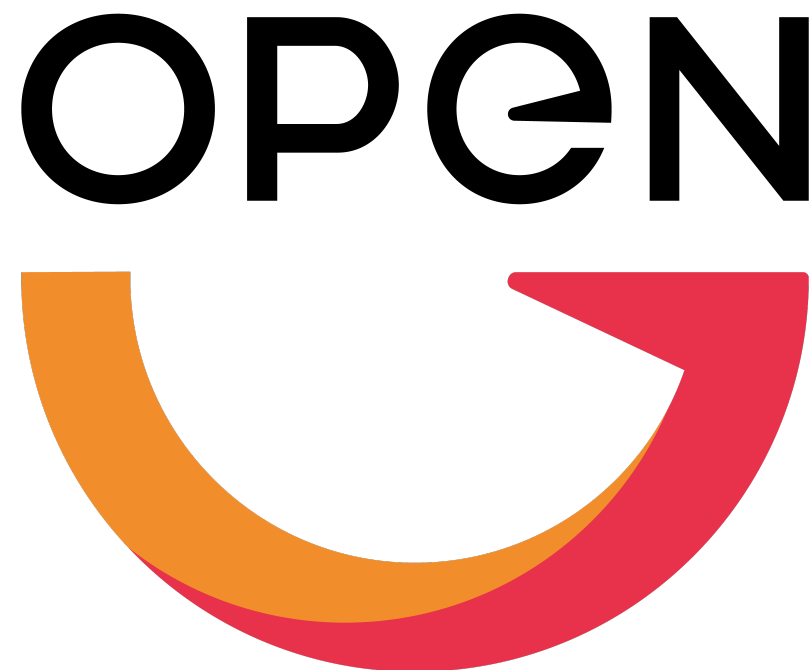

目指す方向性と実現したい世界観（初期ディスカッション）

- 将来の増産に対応すべく、生産性の向上と業務の高度化（≡リスクの検知・対処の早期化）を実現していきたい

今後目指したいこと

【背景として】

- 今後飛昇体の増産が待ち構える中、納入遅延のリスク(≡事業性悪化のリスク)は可能な限り低減させなければいけない
- 要となる生産管理においては、増加する物量/バリエーションに対応していかなければならないが、スキル・経験が必要な業務の特性上単なる人員補強で補うには限界もある

我々が目指したいことは・・・

【生産性向上】
一人当たりの
対応範囲を拡大する

【高度化】
より確実に/早期に
リスク検知・対処を
できるようにする

より効率的に・高度に業務を回せるようにし、
来る増産に対応できる仕組み・体制にしてい

実現したい業務の状態（コンセプト）

生産管理の仕事の流れ

検知

- 手作業での情報収集・情報加工
(高い作業負荷)
- 収集する情報や加工方法も人によるばらつきがある
(属人化)

評価

- 分析方法や結果の評価、対処方法の考え方が人によってばらつきがある
(属人化(経験値による格差)、検知漏れのリスク)

判断・実行

- サプライヤー含めた関係者との泥臭い合意形成
(事業形態上、避けては通れない)

現状

実現したい世界観

- 標準化された方法/自動化された方法での情報収集と加工ができる
⇒ 効率UP、脱属人化

- 標準化された方法/自動化された方法での影響分析・評価ができる
- 過去の経験を蓄積し、ベストな対応案が誰でも分かるようになる
⇒ 効率UP、脱属人化

- リスク予測に必要な情報の自動収集・リスクの自動予測・評価ができ、予測されるリスクに先手を打てる
⇒ 高度化

優先したい領域

- 合意形成や工程への反映に必要なアクションが誰でも分かるようになり、抜け漏れなくアクションに移ることができる
⇒ 効率UP、脱属人化

特に作業負荷/属人性が高い(と思われる)領域を優先して実現していきたい

内製部品生産管理が抱える課題

- 生産量増に伴い、全体像把握、事業としての優先度付け、それに紐づいたアクションをとることが難しくなった結果、これまでの各担当者のベストエフォートに頼るやり方では限界を迎えている

内製部品生産管理の仕事の流れ						
概要	検知		評価		判断・実行	
	情報収集	集約・可視化	影響分析	対応案の策定	関係者調整	反映・指示
	現場の進捗、部品の納入状況、設計変更の有無を把握する	バラバラな情報を突き合わせ、全体像を整理する	発生した遅延や変更が、後続工程や納期にどう響くか分析する	リカバリー案（残業、工程入替等）を複数検討し、評価する	製造、設計、調達、サプライヤと合意形成を行う	決定した計画をシステムや現場の指示書に反映する
課題	■ 基本的な情報収集は“小日程アプリ”の中に集約される仕組みになっている ■ 一方で、工程員が実際に動いた実績(現場の状況)は、工程員のメモか頭の中になく、リアルな進捗状況/部品所在地/ステータスが追えないケースもある ■ (副次的な課題だが)リアルな情報が取れないことによって、工程員への指示が実態に即さず、効率を下げる場面もある ■ 止まっているはわかるけど、なんで止まっている？の深掘は時間がかかる		■ 工程員(主担当)一人が面倒を見るべき部品点数が多く、情報を追いきることが難しい ■ 小日程アプリを活用すれば、各部品の進捗度合いは確認できるが、部品単位で検索が必要なこともあり、全体像の把握は難しい		■ 計画納期リスト(ハラショーリスト)に対する進捗度・リスク評価は、明示的な基準ではなく、経験則がベースになっており、属人化の温床に。 ■ 情報量超過ですべてを評価しきれず、全体を通した状況把握はできていない ■ 結果的に、早期に対処すべきものが放置され、事態が深刻になる	
	■ 大半(感覚値で9割)の事象は、発生した週のうちに対処すれば、無理を通すようなリカバリは不要 ■ 他事業部の部品が入り込むという難しさはあるものの、各々が個別最適で動いており、全体最適を意識した対応案を出す人・仕組みはない ■ 対応案(調整案)は自部品優先一択で、トレードオフは提示できていない ■ 全体最適を意識するための共通言語（中日程）の浸透は道半ば		■ 本来的な会社として(事業部として)の優先度を基準にした調整を行うことができておらず、パワーバランスなど人間関係ベースでの調整が常態化している ■ 全体の進捗状況・緊急度を把握できていないため、場当たり的な指示になっている（≒全指示最優先） ■ 指揮命令システムの整備は不十分であり、主担当・副担当で動くことが前提になっておらず、副担当は方々からの依頼に忙殺される ■ 結果的に、工程員は来順に対応することしかできず、本来優先すべきものが後回しになるケースも			


内製部品生産管理が抱える課題

緊急度：高

緊急度：中

緊急度：低

- 優先度が見えないために、重大な見落としによるリカバリー負荷増に陥っているか

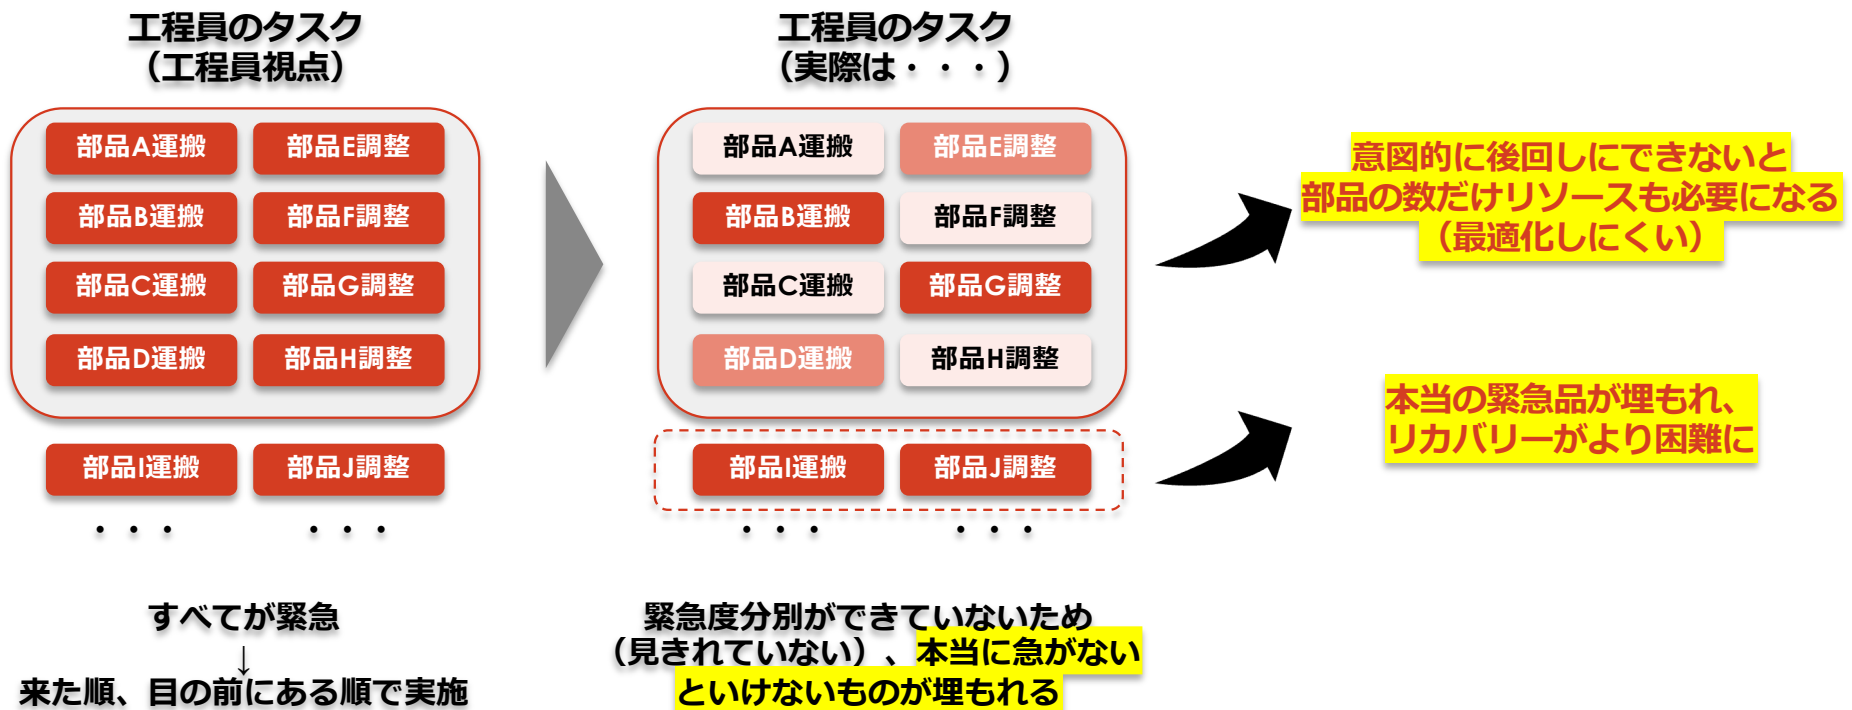


内製部品生産管理が抱える課題

緊急度：高

緊急度：中

緊急度：低

- 起点であり、属人化の温床でもある緊急度・優先度の見極めを全体として正しく行えるようにすることが重要か

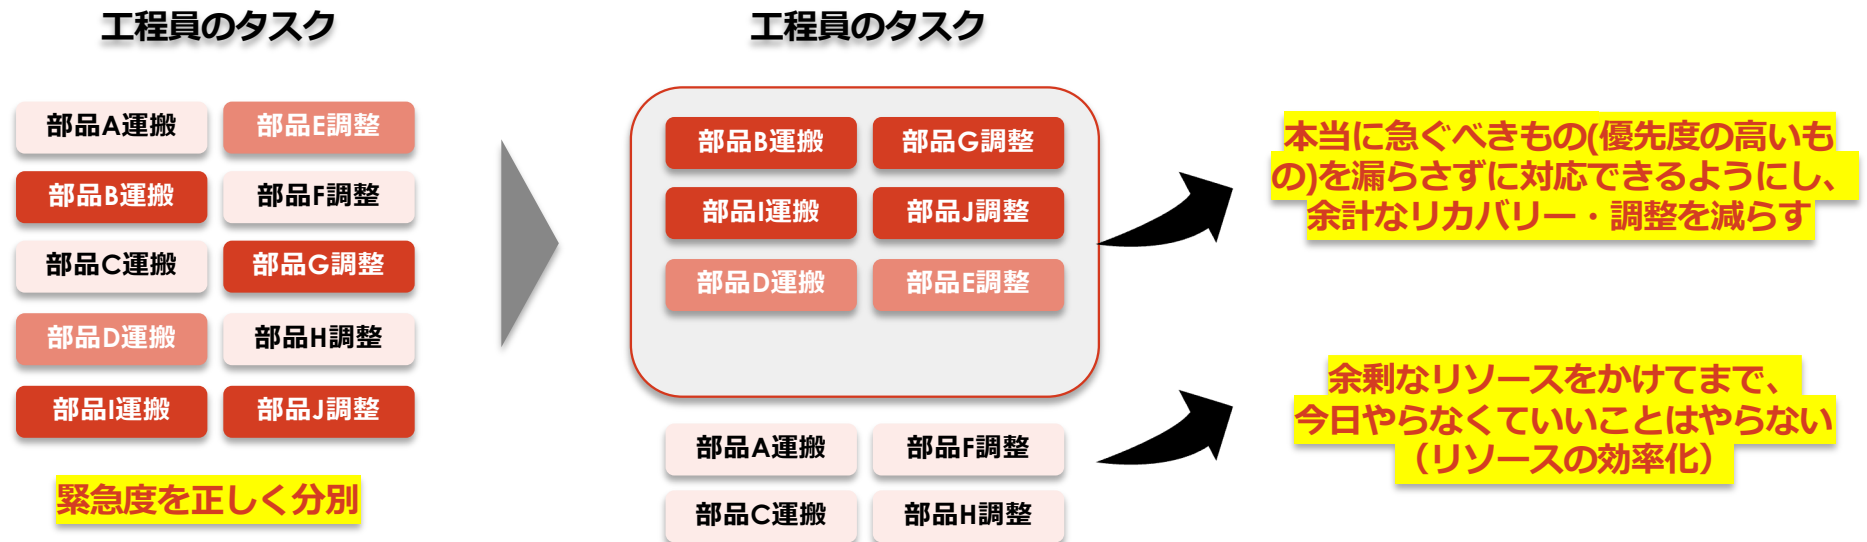


内製部品生産管理が抱える課題

■ 起点であり、属人化の温床でもある緊急度・優先度の見極めを全体として正しく行えるようにすることが重要か

内製部品生産管理の仕事の流れ						
概要	検知		評価		判断・実行	
	情報収集	集約・可視化	影響分析	対応案の策定	関係者調整	反映・指示
	現場の進捗、部品の納入状況、設計変更の有無を把握する	バラバラな情報を突き合わせ、全体像を整理する	発生した遅延や変更が、後続工程や納期にどう響くか分析する	リカバリー案（残業、工程入替等）を複数検討し、評価する	製造、設計、調達、サプライヤと合意形成を行う	決定した計画をシステムや現場の指示書に反映する
課題	■ 基本的な情報収集は“小日程アプリ”の中に集約される仕組みになっている ■ 一方で、工程員が実際に動いた実績（現場の状況）は、工程員のメモか頭の中になく、リアルな進捗状況/部品所在地/ステータスが追えないケースもある ■ （副次的な課題だが）リアルな情報が取れないことによって、工程員への指示が実態に即さず、効率を下げる場面もある ■ 止まっているはわかるけど、なんで止まっている？の深掘は時間がかかる	■ 工程員（主担当）一人が面倒を見るべき部品点数が多く、情報を追いきることが難しい ■ 小日程アプリを活用すれば、各部品の進捗度合いは確認できるが、部品単位で検索が必要なこともあり、全体像の把握は難しい	■ 計画納期リスト（ハラショーリスト）に対する進捗度・リスク評価は、明示的な基準ではなく、経験則がベースになっており、属人化の温床に。 ■ 情報量超過ですべてを評価しきれず、全体を通した状況把握はできていない ■ 結果的に、早期に対処すべきものが放置され、事態が深刻になる	■ 大半（感覚値で9割）の事象は、発生した週のうちに対処すれば、無理を通すようなリカバリは不要 ■ 他事業部の部品が入り込むという難しさはあるものの、各々が個別最適で動いており、全体最適を意識した対応案を出す人・仕組みはない ■ 対応案（調整案）は自部品優先一択で、トレードオフは提示できていない ■ 全体最適を意識するための共通言語（中日程）の浸透は道半ば	■ 本来的な会社として（事業部として）の優先度を基準にした調整を行うことができておらず、パワーバランスなど人間関係ベースでの調整が常態化している	■ 全体の進捗状況・緊急度を把握できていないため、場当たり的な指示になっている（≒全指示最優先） ■ 指揮命令システムの整備は不十分であり、主担当・副担当で動くことが前提になっておらず、副担当は方々からの依頼に忙殺される ■ 結果的に、工程員は来た順に対応することしかできず、本来優先すべきものが後回しになるケースも
	緊急度を正しく分別するために、 情報集約・可視化・影響分析に軸足を置く					

緊急度の考え方

- 納期と、現場の状況を加味して緊急度を設定することを考えている

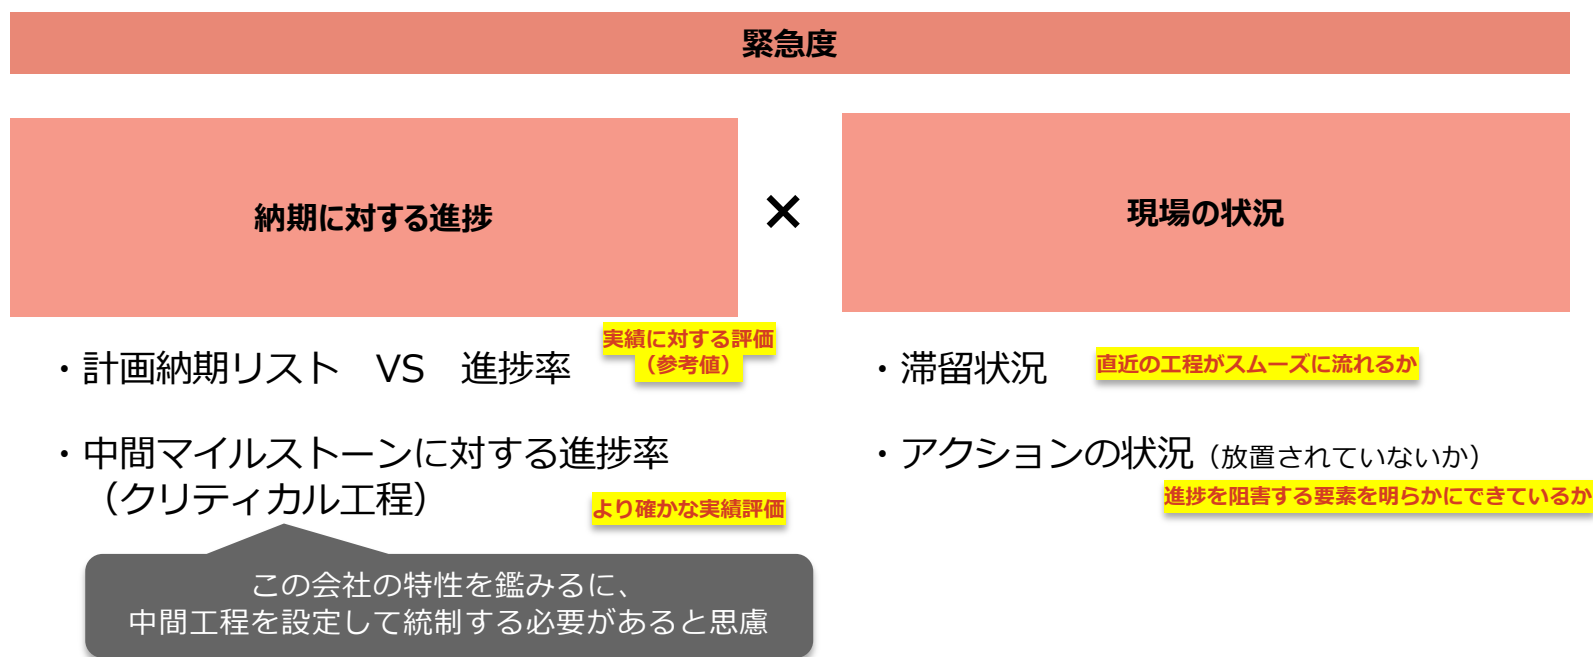

- 論点
 - ・ 中間マイルストーンをどう考えて、どのように設定するか
 - ・ 滞留の影響をどう見るか

緊急度の設定要素（案）

- 緊急度の算出要素は以下のように考えている（緊急度をどのように算出し、表現するかは残論点）

①計画納期からの逆算日数

※メイン

- ・ 現在日時に、未消化の各工程の標準工数（日数）*₁ を足し合わせることで「予想納期」を算出する。
- ・ 「予想納期」と「計画納期リスト上の納期」を比較し、日数を算出する。

※備忘

予定納期リストは「月末での完成部品数」を管理するもののため、算出には工夫が必要と思慮 ※データ受領次第確認

②進捗率

- ・ 各工程に算出 完了済み工程数 / 全工程数
- ・ クリティカル工程*₂の達成数 ○工程/○工程

③滞留日数

- ・ 着手滞留：部品の到着からIWにならない状態の日数



④工程経過日数

- ・ 工程内で経過した日数
- ・ 工程の標準日数*₁との差分を表示

⑤アクション状況

- ・ 工程進捗をフォローするためのアクションの有無

*₁,*₂ データに基づいて算出/設定する独自の変数

必要なシステム機能

- 明らかになった課題（現状）に対して、必要になる機能を以下のように整理している
- 本フェーズでは、担当部品全体から、緊急度（進捗リスク）が高い部品を一覧化する機能を提供し、作業の優先順位をつけやすい状態を目指す

現状	目指す姿	必要な機能	
全てのタスクが優先となり、本当の優先順位に従って作業を進めることが難しい	緊急度に基づき作業を計画し、実行することができる	必要な情報を閲覧	①担当する部品の中で、緊急度が高いものが一覧でわかるダッシュボード
部品点数が多く、全体像を把握しながら指示を出すことが難しい	緊急度に基づき、もれなく指示ができる		②統一された基準に基づいて、緊急度担当部品のリスト
「計画納期リスト」に記載されているすべての部品のフォローアップすることが難しい	フォローすべき部品の状況を漏れなく、速やかに確認することができる	タスク管理	③計画納期リストから各部品の状況を、速やかに追いかけることができる画面
誰が何を実施したかを把握することが難しく、どの部品をフォローすべきか判断ができない。 またチームでのフォローアップをしづらい	指示されたタスクの実施状況を、チームで把握し、作業の重複を防ぐことや、フォローアップすることができる		④緊急度の高い部品リストに対して、誰が何をやったかが一覧でわかる画面



この後、画面イメージをお見せするので、忌憚なくご意見ください！

システム機能（画面イメージ）

■ ①ダッシュボード

緊急度の高い部品のサマリを表示

部品進捗・
優先順位モック

JOB-SHOP方式の自社部品工場向け。
工程員が「今フォローすべき部品」をすぐ見つけ
る操作感モック。

ダッシュボード

予定納期リスト

担当部品一覧

部品詳細

ダッシュボード

赤い項目ほど優先。クリックで一覧・詳細へ遷移できます。

今日フォロー 必要

42

優先度A/Bのうち即アクション対象

納期逆算リスク 高

27

停滞がなくても納期上危険な部品

納期逆算リスク 中

6

今選中の先回り確認候補

2日以上停滞

26

停滞工程に絞ってフォロー

今日のフォロー対象

工程員が今すぐ動くべき部品を上から優先順で表示

誘導翼ブラケット-29 (P-70029)

ミサイル / 現在工程：出荷準備 / 滞留 3日

納期逆算リスク：高 / 停滞がなくても納期上危険

次アクション：熱処理SHOPへ進捗確認し、必要なら前倒し調整

優先度 A

納期逆算 高

要フォロー

推進ノズルカラー-14 (P-70014)

ミサイル / 現在工程：素材準備 / 滞留 1日

納期逆算リスク：高 / 停滞がなくても納期上危険

次アクション：外注管理へ進捗確認し、必要なら前倒し調整

優先度 A

納期逆算 高

要フォロー

推進ノズルカラー-49 (P-70049)

ミサイル / 現在工程：素材準備 / 滞留 0日

納期逆算リスク：高 / 停滞がなくても納期上危険

次アクション：外注管理へ進捗確認し、必要なら前倒し調整

優先度 A

納期逆算 高

要フォロー

誘導翼ブラケット-43 (P-70043)

ミサイル / 現在工程：穴あけ / 滞留 5日

納期逆算リスク：高 / 停滞がなくても納期上危険

次アクション：熱処理SHOPへ進捗確認し、必要なら前倒し調整

優先度 A

納期逆算 高

要フォロー

納期逆算リスク

停滞していても、納期から逆算すると危ない部品を表示

P-70008 / 誘導翼ブラケット-08

納期逆算リスク：高 / 残3日・残工程6

残3日・残工程6。先回り確認候補。

納期逆算 高

詳細を見る

P-70015 / 誘導翼ブラケット-15

納期逆算リスク：高 / 残3日・残工程3

残3日・残工程3。先回り確認候補。

納期逆算 高

詳細を見る

P-70035 / 推進ノズルカラー-35

納期逆算リスク：高 / 残3日・残工程3

残3日・残工程3。先回り確認候補。

納期逆算 高

詳細を見る

P-70049 / 推進ノズルカラー-49

納期逆算リスク：高 / 残3日・残工程7

残3日・残工程7。先回り確認候補。

納期逆算 高

詳細を見る

10

システム機能（画面イメージ）

■ ②緊急度リスト

部品進捗・
優先順位モック

JOB-SHOP方式の自社部品工場向け。
工程員が「今フォローすべき部品」をすぐ見
ける操作版モック。

ダッシュボード

予定納期リスト

担当部品一覧

部品詳細

担当部品一覧

優先度の色分けと、フォロー対象を赤帯で強調しています。

完成品分類：すべて

優先度：すべて

担当SHOP：すべて

担当者：すべて

フォロー対象のみ：OFF

「進捗」「CP進捗」「納期予測」「着手停滞」「工程経過日数」という指標を用いて
緊急度を算出する想定です。

緊急度	完成品分類	部品番号	部品名	予定納期	現在工程	担当SHOP	進捗率	CP工程進捗	納期予測	着手停滞日数	工程経過日数	担当者	タスク	チェック	備忘
5	ミサイル	P-70008	誘導翼ブラケット-08	06/26	検査	熱処理SHOP	50%	2/5工程	06/28 +2日	0日	1日	佐藤 健	熱処理SHOPへ進捗確認し、必	☐	
5	ミサイル	P-70014	推進ノズルカラー-14	06/20	素材準備	外注管理	43%	2/5工程	06/24 +4日	1日	18日 +15日	藤田 宏	外注管理へ進捗確認し、必要	☐	
5	ミサイル	P-70015	誘導翼ブラケット-15	06/21	熱処理	熱処理SHOP	50%	3/6工程	06/27 +6日	0日	8日 +7日	佐藤 健	熱処理SHOPへ進捗確認し、必	☐	
5	ミサイル	P-70021	推進ノズルカラー-21	06/27	素材準備	外注管理	43%	2/5工程	06/22	2日	21日 +19日	藤田 宏	外注管理へ進捗確認し、必要	☐	
5	ミサイル	P-70022	誘導翼ブラケット-22	06/28	切削2	熱処理SHOP	50%	3/6工程	06/30 +2日	2日	13日 +12日	佐藤 健	熱処理SHOPへ進捗確認し、必	☐	
5	ミサイル	P-70028	推進ノズルカラー-28	06/22	素材準備	外注管理	43%	1/3工程	06/21	3日	19日 +18日	藤田 宏	外注管理へ進捗確認し、必要	☐	
5	ミサイル	P-70029	誘導翼ブラケット-29	06/23	出荷準備	熱処理SHOP	50%	2/5工程	06/30 +7日	3日	1日	佐藤 健	熱処理SHOPへ進捗確認し、必	☐	
5	ミサイル	P-70035	推進ノズルカラー-35	06/29	素材準備	外注管理	43%	1/3工程	06/19	0日	22日 +18日	藤田 宏	外注管理へ進捗確認し、必要	☐	
5	ミサイル	P-70036	誘導翼ブラケット-36	06/18	研磨	熱処理SHOP	50%	2/5工程	06/26 +8日	4日	8日 +5日	佐藤 健	熱処理SHOPへ進捗確認し、必	☐	
5	ミサイル	P-70042	推進ノズルカラー-42	06/24	素材準備	外注管理	43%	2/5工程	06/22	5日	20日 +17日	藤田 宏	外注管理へ進捗確認し、必要	☐	

システム機能（画面イメージ）

■ ③計画納期リスト

予定納期リストの各行から、
詳細進捗を表示する

部品進捗・
優先順位モック

JOB-SHOP方式の自社部品工場向け。
工程長が「今フォローすべき部品」をすぐ見つけ
ける操作版モック。

ダッシュボード

予定納期リスト

担当部品一覧

部品詳細

優先度凡例

A：今日中にフォロー

予定納期リスト

必要数・実績・完了予定日を一覧で確認し、評価を自動表示します。

予定納期リスト

担当者が完了予定日と対策/アクションを直接編集。評価は「実績」と「今月必要数」から自動判定します。

OSID件数

5

予定納期リストの対象件数

評価○

1

今月必要数を実績で達成

評価△

3

不足あり・完了予定日入力済み

評価×

1

不足あり・対策要

OSID	部品名	再来月必要数	来月必要数	今月必要数	実績	評価	完了予定日	対策/アクション
OS-240601-001	誘導翼ブラケット	48	30	18	12	△	06/24	熱処理SHOPへ前倒し依頼。外注便の増便も確認。
OS-240601-002	ロータ軸受ケース	22						
OS-240601-003	燃焼室リング	40						
OS-240601-004	姿勢制御ハウジング	36						
OS-240601-005	油圧マニピュル	30						

部品進捗・
優先順位モック

JOB-SHOP方式の自社部品工場向け。
工程長が「今フォローすべき部品」をすぐ見つけ
ける操作版モック。

ダッシュボード

予定納期リスト

担当部品一覧

部品詳細

部品詳細

工程全体を1画面で確認し、止まっている工程だけをすぐ把握できます。

誘導翼ブラケット (P-48291)

ミサイル 予定納期 06/19 現在工程 熱処理 優先度 A 納期遅延 高

工程タイムライン

バーは短く区画表示し、各工程の予定日と完了日を並べて確認

1. 素材準備

完了

標準LT

4日

数ヶ月前日

06/03

完了予定日

06/07

完了日

06/07

完了予定日

06/07

2. 切削1

完了

標準LT

1日

数ヶ月前日

06/07

完了予定日

06/08

完了日

06/09

完了予定日

06/08

3. 切削2

完了

標準LT

2日

数ヶ月前日

06/08

完了予定日

06/10

完了日

06/10

完了予定日

06/10

4. 穴あけ

完了

標準LT

3日

数ヶ月前日

06/10

完了予定日

06/13

完了日

06/14

完了予定日

06/13

5. 洗浄

完了

標準LT

4日

数ヶ月前日

06/13

完了予定日

06/17

完了日

06/17

完了予定日

06/17

6. 熱処理

4日停滞

標準LT

1日

数ヶ月前日

06/17

完了予定日

06/18

完了日

—

完了予定日

06/18

7. 研磨

未着手

標準LT

2日

数ヶ月前日

06/18

完了予定日

06/20

完了日

—

完了予定日

06/20

この部品は今日のフォロー対象です

組立必要日まで残4日、熱処理24日停滞。

次アクション：熱処理SHOPへ本日に進捗確認

振当SHOP：熱処理SHOP

組立影響度：高

納期遅延リスク

判定：高（停滞がなくても納期上危険）

組立必要日まで残 4日 / CR 0.82

残工程負荷

残工程数 5

必要日数予想 10日

進捗率 68%

システム機能（画面イメージ）

■ ④タスク管理（部品一覧）

部品進捗・
優先順位モック

JOB-SHOP方式の自社部品工場向け。
工程員が「今フォローすべき部品」をすぐ見つけ
る操作版モック。

ダッシュボード

予定納期リスト

担当部品一覧

部品詳細

担当部品一覧

優先度の色分けと、フォロー対象を赤帯で強調しています。

完成品分類：すべて

優先度：すべて

担当SHOP：すべて

担当者：すべて

フォロー対象のみ：OFF

担当部品一覧

行をクリックすると部品詳細へ遷移。優先度とフォロー対象を色で判別。

喫緊度	完成品分類	部品番号	部品名	予定納期	現在工程	担当SHOP	進捗率	CP工程進捗	納期予測	着手停滞日数	工程経過日数
S	ミサイル	P-70036	誘導翼ブラケット-36	06/18	研磨	熱処理SHOP	50%	2/5工程	06/26 +8日	4日	8日 +5日
S	ミサイル	P-48291	誘導翼ブラケット	06/19	熱処理	熱処理SHOP	50%	3/6工程	06/28 +9日	4日	7日 +6日
S	エンジン	P-70037	燃焼室リング-37	06/19	荒加工	機械加工SHOP	44%	2/4工程	06/26 +7日	4日	18日 +15日
S	ミサイル	P-70049	推進ノズルカラー-49	06/19	素材準備	外注管理	43%	2/5工程	06/25 +6日	0日	18日 +16日
S	ミサイル	P-70014	推進ノズルカラー-14	06/20	素材準備	外注管理	43%	2/5工程	06/24 +4日	1日	18日 +15日
S	ミサイル	P-70050	誘導翼ブラケット-50	06/20	素材準備	熱処理SHOP	50%	3/6工程	06/29 +9日	0日	22日 +19日
S	ミサイル	P-66340	推進ノズルカラー	06/21	外注表面処理	外注管理	43%	1/3工程	06/18	5日	16日 +12日

作業の実施状況をシンプルに管理
(担当者、タスク、チェック、備忘)

担当者	タスク	チェック	備忘
佐藤 健	熱処理SHOPへ進捗確認し、	☐	
佐藤 健	熱処理SHOPへ本日に進捗	☒	熱処理返却時刻を確認中
田中 遼	機械加工SHOPへ進捗確認し、	☐	
藤田 宏	外注管理へ進捗確認し、必ず	☐	
藤田 宏	外注管理へ進捗確認し、必ず	☐	
佐藤 健	熱処理SHOPへ進捗確認し、	☐	
藤田 宏	外注先へ即確認、戻り予定も	☒	外注戻り日を確認中

実施済みはグレイアウト

※ネクストアクションが明確で、
自分がボールを持たないように
タスクを設定することが肝要（運用ルール）

13

システム機能（画面イメージ）

■ 参考：SHOPに対する優先順位の調整支援（部品一覧）

担当
優先度の色

対象のSHOPを絞り込み、同一SHOPに存在する部品リストを表示し、より緊急度の高い部品は何かを探索できる

完成品分類：すべて 優先度：すべて 機械加工SHOP 担当者：すべて フォロー対象のみ：OFF

燃費度	完成品分類	部品番号	部品名	予定納期	現在工程	担当SHOP	進捗率	CP工程進捗	納期予測	着手待ち日数	工程経過日数	担当者	タスク	チェック	備注
●	エンジン	P-70037	燃焼室リング-37	06/19	加工	機械加工SHOP	44%	2/4工程	06/26 +7日	4日	18日 +15日	田中 遼	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
●	ハリ	P-70039	配線固定プレート-39	06/21	梱包	機械加工SHOP	25%	1/4工程	06/26 +5日	4日	1日	伊藤 彩	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
●	ハリ	P-70041	油圧マニホールド-41	06/23	設置	機械加工SHOP	13%	0/4工程	06/23	5日	19日 +16日	中島 拓海	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
●	ハリ	P-70018	配線固定プレート-18	06/24	切削2	機械加工SHOP	25%	2/4工程	06/25 +1日	1日	12日 +11日	伊藤 彩	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
●	エンジン	P-70044	燃焼室リング-44	06/26	梱包	機械加工SHOP	44%	2/5工程	06/27 +1日	5日	1日	田中 遼	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
●	エンジン	P-70009	燃焼室リング-09	06/27	素材受入	機械加工SHOP	44%	2/4工程	06/28 +1日	0日	18日 +16日	田中 遼	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
●	ハリ	P-70046	配線固定プレート-46	06/28	検査	機械加工SHOP	25%	2/4工程	06/23	5日	4日 +3日	伊藤 彩	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
●	エンジン	P-70023	燃焼室リング-23	06/29	仕上げ加工待ち	機械加工SHOP	44%	2/6工程	06/29	2日	5日 +4日	田中 遼	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
A	エンジン	P-37510	燃焼室リング	06/20	仕上げ加工	機械加工SHOP	44%	2/5工程	06/25 +5日	3日	12日 +9日	田中 遼	仕上げ加工の着工時刻を確認し、必要なら前!	☒	稼働停止し替え依頼済み
A	エンジン	P-70016	燃焼室リング-16	06/22	最終検査	機械加工SHOP	44%	2/5工程	06/24 +2日	1日	5日 +1日	田中 遼	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
A	エンジン	P-70030	燃焼室リング-30	06/24	中間検査	機械加工SHOP	44%	2/5工程	06/25 +1日	0日	14日 +12日	田中 遼	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
A	ハリ	P-70032	配線固定プレート-32	06/26	素材受入	機械加工SHOP	25%	0/4工程	06/24	3日	20日 +19日	伊藤 彩	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
A	ハリ	P-70034	油圧マニホールド-34	06/28	プレス	機械加工SHOP	13%	1/4工程	06/26	4日	11日 +10日	中島 拓海	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
B	ハリ	P-70027	油圧マニホールド-27	06/21	穴あけ	機械加工SHOP	13%	1/4工程	06/24 +3日	3日	13日 +10日	中島 拓海	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
B	ハリ	P-70011	配線固定プレート-11	06/29	穴あけ	機械加工SHOP	25%	1/4工程	06/23	0日	14日 +11日	伊藤 彩	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
C	ハリ	P-70025	配線固定プレート-25	06/19	切削1	機械加工SHOP	25%	1/4工程	06/22 +3日	0日	20日 +17日	伊藤 彩	機械加工SHOPへ進捗確認し、必要なら前!	☐	
C	ハリ	P-28644	配線固定プレート	06/25	切削2	機械加工SHOP	25%	0/4工程	06/26 +1日	1日	15日 +12日	伊藤 彩	今週中に負荷状況を確認	☐	

※将来的には、AIを利用して、チャット画面で調整案を出力するようなイメージ

システムの利用イメージ

■ 利用シーンとしては以下を想定しています。


★ システムを参照する主要なタイミング

午前


午後

★ チーム
朝会

ダッシュボードとリストに基づきタスクを指示



同じSHOPでソートし、
優先作業のトレードオフを提案



各工程員のフォロー

計画納期リストのアップデート


予定納期リストと部品詳細に基づき、進捗を確認



★ チーム
朝会

各作業・実施報告


リストを参照し、緊急度の高いタスクから作業を着手



※場合によっては
プリントアウトして持ち出し

各作業・実施報告

リストに対して、実施したタスクを反映



※チェックマーク、
備考欄への記載

リーダー

工程員
